

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 12. møde

1. Godkendelse af dagsorden
2. Status
3. Overvejelser om strukturering af implementeringen
4. Skitser til handlingsplan
5. Orientering om den formelle implementering
6. Status for arbejdet med gennemførelsesbestemmelserne
7. Organisatoriske overvejelser
 - Overvejelser om et INSPIRE netværk
 - Organisering af kommende høringer vedr.
 - gennemførelsesbestemmelserne
 - LMO'ernes involvering/engagement i implementeringsarbejdet
8. Følgegruppens ansvarsområde og sammensætning
9. Orientering om / diskussion af kommende aktiviteter
10. Kommende møder
11. Evt.

2. STATUS

Overordnet tidsplan:

I kraft	15. maj 2007
Implementering i Danmark	15. maj 2009
Første tekniske løsning	15. maj 2010
Første rapportering	15. maj 2010

AKTIVITETER siden sidst:

KMS er EU-kontaktpunkt

JR dansk repræsentant i INSPIRE udvalget (første møde den 26/6)

INSPIRE konferencen

Præsentationer:

- Finansministeriet

- KMD

- Maj-konferencen

- FOT-bestyrelsen

- Den Digitale Taskforce

Artikel i Landinspektøren

Artikel i Miljø Danmark

Kortdage 2007

GMES

Nordisk INSPIRE møde den 6. marts

Ny hjemmeside

3. STRUKTURERING AF IMPLEMENTERING

FORSKELLE

INSPIRE har et europæisk fundament

INSPIRE har en global dimension via GMES (GEOSS)

INSPIRE går på tværs af danske sektorer

INSPIRE giver en retslig ramme



IMPLEMENTERING 2007-2019

Fase	Aktivitet	Tidsramme
1	Formel implementering	2009
2	Gennemførelsesbestemmelser	2012
3	Implementering af infrastrukturkomponenterne og de første data	2011
4	Implementering af de resterende data	2019

IMPLEMENTERING 2007-2019			
Fase	Aktivitet	Tidsramme	
1	Formel implementering		
	1	Handlingsplan for implementering	1.halvår 2007
	2	Organisatoriske tiltag	2007-2009
	3	Implementering i dansk lovgivning	15. maj 2009
	4	Kommunikation	2019
2	Gennemførelsesbestemmelser		
	1	Metadata høring	2008
	2	Interoperabilitet for bilag 1 data og tilhørende tjenester	2009
	3	Interoperabilitet for bilag 2 og 3 data og tilhørende tjenester	2012
	4	Service arkitektur / Nettjenester	2009
	5	EU institutioners adgang til data	2011
	6	Overvågning og rapportering	2009?

3	Implementering af infrastrukturkomponenterne og de første data		
	1	Nettjenester for metadata klar til brug	2010
	2	Metadata for bilag 1 og 2 data klar til brug	2010
	3	Nettjenester for data klar til brug	2011
	4	Bilag 1 data, indsamlet/omstruktureret for nylig, klar til brug	2011
	5	Videregivelse af data, aftalegrundlag og økonomi	2011?
	6	Første rapportering	15. maj 2010
4	Implementering af de resterende data		
	1	Metadata for bilag 3 data klar til brug	2013
	2	Anden rapportering	15. maj 2013
	3	Bilag 2 og 3 data, indsamlet /omstruktureret for nylig, klar til brug	2014
	4	Resterende bilag 1 data klar til brug	2016
	5	Resterende bilag 2 og 3 data klar til brug	2019

4. SKITSER TIL HANDLINGSPLAN

Handlingsplan for implementering:

Indholdskrav:

- **Implementering i lovgivning**
- **Særlig koordination med andre ministerier**
- **Tidsplan for implementeringsarbejdet**

Implementering i lovgivning:

- Retsakten planlægges implementeret ved etablering af ny lov om INSPIRE.
- De tekniske implementeringsregler planlægges implementeret ved bekendtgørelser
- Tidshorisont for seneste fremsættelse af lovforslag er efterår 2008

Særlig koordination med andre ministerier:

- Ministerier, der måtte have lovgivning, som kan blive påvirket
- Dataansvarlige iht. Annex 1-3
- Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder / Digital Taskforce
- Servicefællesskabet for Geodata
- VTU's standardiseringsarbejde (OIO-XML)

Vurdering af omkostninger INSPIRE 2009 - 2014


Niveau 2004; 1 ÅV = 750.000 kr.

År	2009	2010	2011	2012	2013	2014	I alt '09-'14
Investe- ring	2,1	2,1					4,2
Drift	5,5-8	5,5,-8	4,5-6	4,5-6	4,5-6	3-5	27,5-39
National INSPIRE	2,0- 2,5	2,0- 2,5	1,0-1,5	1,0- 1,5	1,0- 1,5	1,0- 1,5	8-11
Indsam. metadata	1,0- 2,0	1,0- 2,0	2,0-2,5	2,0- 2,5	2,0- 2,5	0,5	8-12
Drift af tjenester	2,5- 3,5	2,5- 3,5	1,5-2,0	1,5- 2,0	1,5- 2,0	1,5- 2,5	11-15,5
I alt	8-10	8-10	4,5-6	4,5-6	4,5-6	3-5	32-43

5. DEN FORMELLE IMPLEMENTERING

Formel implementering: 2009

Den tekniske implementering

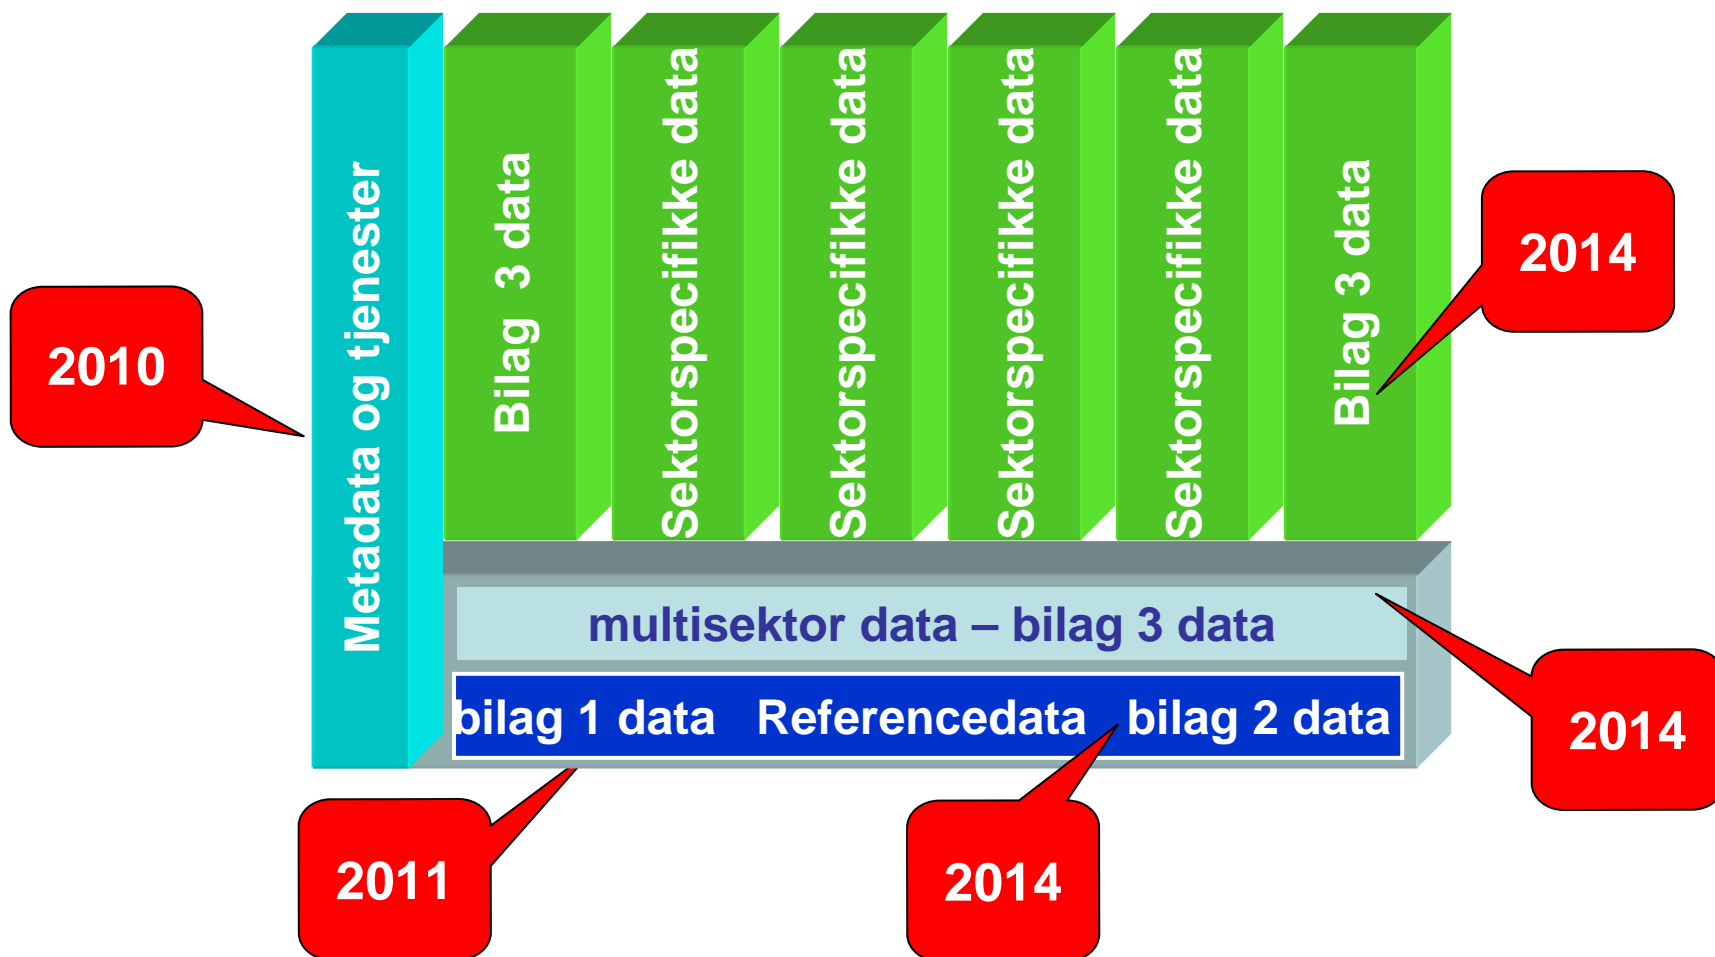

6. GENNEMFØRELSESBESTEMMELSERNE

TIDSRAMMER FOR GENNEMFØRELSE AF INSPIRE

	Tidsramme for vedtagelse af gennemførelsesbestemmelserne	Tidsramme for at stille data og tjenester til rådighed i.h.t. gennemførelsesbestemmelserne	Data og tjenester senest til rådighed
Metadata for bilag I og II datasæt klar til brug	1 år (art.5 stk. 4)	2år (art. 6 stk. 1a))	2010
Metadata for bilag III datasæt klar til brug		5 år (art. 6 stk. 1b))	2013
Bilag I datasæt, indsamlet og omstruktureret for nylig klar til brug	2 år (art. 9 stk. 1a))	2år (art. 7 stk. 3)	2011
Resterende bilag I datasæt klar til brug		7år (art. 7 stk. 3)	2016
Bilag II og III datasæt, indsamlet og omstruktureret for nylig, klar til brug	5 år (art. 9 stk. 1b))	2år (art. 7 stk. 3)	2014
Resterende bilag II og III datasæt klar ti brug		7 år (art. 7 stk. 3)	2019

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER: METADATA

Deliverable	Title	Milestone	Who
MD-D1.3	Draft Implementing Rules for metadata	2007-01	DT
	Launch of SDICs/LMOs consultation of draft IR	2007-02	SDIC/LMO
MD-D1.3	Revised Draft IR	2007-06	CT
	Launch of public consultation on revised draft IR	2007-06	Public
MD-D1.3	Final draft Implementing Rules for metadata submitted to regulatory committee	2007-11	CT
	Adoption of IR for the creation and updating of metadata	2008-05	Comitology

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER: TEMABESKRIVELSERNE

Deliverable	Description	Milestone	Who
DS-D2.3	Draft Definition and scope of Annex Themes	2007-05	DT
	Launch of SDIC/LMO consultation on draft Definition and scope of Annex Themes	2007-05	SDIC, LMO
DS-D2.3	Final Definition and scope of Annex Themes	2007-10	CT
DS-D2.5	Draft Generic Conceptual Model (GCM)	2007-05	DT
	Launch of SDIC/LMO consultation of draft GCM	2007-05	CT
	Methodology testing	2007-07	Selected SDICs LMOs, DT, CT
DS-D2.5	Revised draft GCM	2007-10	CT
DS-D2.5	Final GCM	2008-01	CT
DS-D2.6	Draft Methodology for Specification Development	2007-07	DS DT
	Launch of SDIC/LMO consultation on draft Methodology for Specification Development	2007-07	SDIC/LMO
DS-D2.6	Final Methodology for Specification Development	2008-01	CT
DS-D2.7	Draft IR for Data Exchange	2007-12	DT
	Launch of SDIC/LMO consultation on draft IR for Data Exchange	2007-12	SDIC, LMO
DS-D2.7	Final draft IR for data exchange	2008-06	CT
	Adoption of IR for data exchange	2008-11	Comitology

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER: ANNEX 1 DATA

Deliverable	Description	Milestone	Who
DS-D2.8.x ⁶	Data specification development for Annex I spatial data theme x	2007-11	TWG x
DS-D2.8.x	First draft specification of Annex I spatial data theme x	2008-08	TWG x
	Launch of internal review of first draft specification for Annex I spatial data theme x	2008-08	DT, CT, EIONET
DS-D2.8.x	Draft IR for harmonised data specifications for Annex I spatial data theme x	2008-11	TWG x
DS-D2.8.x	Launch of SDIC/LMO consultation on draft IR for harmonised data specifications for Annex I spatial data theme x	2008-11	SDIC, LMO
	Testing of draft IR for hamonised data specifications for Annex I spatial data theme x	2008-11	Selected SDICs/LMOs, CT, TWG x
DS-D2.8.x	Final draft IR for harmonised data specifications for Annex I spatial data theme x	2009-03	CT
	Adoption of IR for the interoperability and harmonisation of spatial data sets and services for Annex I spatial data theme x	2009-05	Comitology

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER: IT-ARKITEKTUR

Deliverable	Description	Milestone	Who
NS-D 3.7	Draft IR for Discovery and View Services	2007-06	DT
	Launch of SDIC/LMO consultation on draft IR for Discovery and View Services	2007-06	SDIC/LMO
NS-D 3.7	Final draft IR for Discovery and View Services	2008-01	CT
	Adoption of IR for Discovery and View Services	2008-05	Comitology
NS-D 3.9	Draft IR for Download Services	2007-12	DT
	Launch of SDIC/LMO consultation on draft IR for Download Services	2007-12	SDIC/LMO
NS-D 3.9	Final draft IR for Download Services	2008-06	CT
	Adoption of IR for Download Services	2008-11	Comitology
NS-D 3.10	Draft IR for Coordinates Transformation Services	2007-12	DT
	Launch of SDIC/LMO consultation on draft IR for Coordinates Transformation Services	2007-12	SDIC/LMO
NS-D 3.10	Final draft IR for Coordinates Transformation Services	2008-07	CT
	Adoption of IR for Coordinates Transformation Services	2008-11	Comitology

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER: OVERVÅGNING

Deliverable	Description	Milestone	Who
MR-D 5.2	Draft list of indicators for Monitoring	2007-06	DT
MR-D 5.4a	First feasibility test (4 MS, annex I & II, internal to the DT)	2007-06	SDIC/LMO (selection), DT, CT
MR-D 5.2	Reviewed list of indicators, including clarifications	2007-08	DT, CT
MR-D 5.5a	Draft IR for Monitoring and Reporting (internal to the DT and CT)	2007-08	DT
MR-D 5.4b	Second feasibility test (3MS, full scope, call for participation SDICs and LMOs)	2007-08	DT, CT
MR-D 5.5b	Draft IR for Monitoring and Reporting	2007-10	DT
	Launch of SDIC/LMO consultation on draft IR for Monitoring and Reporting	2007-10	SDIC/LMO
MR-D 5.5c	Final draft IR for Monitoring and for Reporting	2008-03	CT
	Adoption of IR for Monitoring and Reporting	2008-05	Comitology
MR-D 5.6	Guidance document on monitoring (use of template spreadsheet, automation issues...)	2008-06	DT, CT

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER: BRUG AF DATA

Deliverable	Description	Milestone	Who
DSS-D 4.9a	Draft IR governing access and rights of use of spatial data sets and services for Community institutions and bodies, including commentary and clarifications on the reasoning behind the draft IR (<i>internal to the DT and CT</i>)	2007-07	DT
DSS-D 4.10	Recommendations accompanying the draft IR	2008-02	DT
DSS-D 4.9b	Draft IR for governing access and rights of use of spatial data sets and services for Community institutions and bodies	2008-05	DT
	Launch of SDIC/LMO consultation on draft IR	2008-07	SDIC/LMO, DT, CT
DSS-D 4.9c	Revised draft IR for governing access and rights of use of spatial data sets and services for Community institutions and bodies	2008-10	CT
	Public consultation on revised draft IR	2008-12	Public, DT, CT
DSS-D 4.9d	Final draft IR for governing access and rights of use of spatial data sets and services for Community institutions and bodies	2009-03	CT
	Adoption of IR governing the access rights of use to spatial data sets and services for Community institutions and bodies	2009-05	Comitology
DSS-D 4.11	Report on best practices	2009-06	DT, CT

7. ORGANISERING

Dansk INSPIRE organisation.

Planen er at etablere tre niveauer:

et INSPIRE netværk

Dansk følgegruppe

MIM følgegruppe

INSPIRE netværk:

De væsentligste interessenter (Geoforum, DDL, IDA,) vil i løbet af juni blive inviteret til en orientering om INSPIRE medio september. Målet er at etablere et netværk der sikrer deltagerne mulighed for adgang til information og i det omfang der er interesse herfor involvering i høringer o.lign.

Dansk følgegruppen:

Dansk følgegruppe der repræsenterer de væsentlige dataejere (altså de institutioner der bliver direkte påvirket af direktivet) fortsætter.

MIM følgegruppe:

For at sikre forankring af INSPIRE i MIM oprettes en MIM-følgegruppe med maks. tre repræsentanter fra hver af institutionerne KMS, SNS, MST, GEUS og CFK. Institutionsrepræsentanterne skal dække områderne data, teknologi/arkitektur og aftalegrundlag.

8. FØLGEGRUPPEN

Netværkstjenester for metadata klar til brug

Det skal vurderes om denne tjeneste kan baseres på en udbygget version af Geodata-INFO eller om der er behov for nyudvikling. Sammenhængen med den europæiske portal skal ligeledes vurderes.

Driftsstart: første halvdel af 2010

Overordnet ansvar: KMS

Projektledelse:

Øvrige involverede: KMS, DS, VD, kommunerne, EBST?, DMU, GEUS

Interne og eksterne interessenter: øvrige omfattede dataejere

Metadata for bilag 1 og 2 data klar til brug

Det skal undersøges i hvor høj grad det er muligt at "oversætte" eksisterende metadata til INSPIRE metadataprofil.

Driftsstart: første halvdel af 2010

Overordnet ansvar: KMS

Projektledelse:

Øvrige involverede: KMS, DS, VD, kommunerne, EBST?, DMU, GEUS

Interne og eksterne interessenter: øvrige omfattede dataejere

Netværkstjenester for data klar til brug

Driftsstart: 2011

Overordnet ansvar: KMS

Projektledelse:

Øvrige involverede: KMS, DS, VD, kommunerne, EBST?

Interne og eksterne interessenter: øvrige omfattede dataejere

Bilag 1 data der er indsamlet/omstruktureret for nylig klar til brug

Driftsstart: 2011

Overordnet ansvar: KMS

Projektledelse:

Øvrige involverede: KMS, DS, VD, kommunerne, EBST?

Interne og eksterne interessenter: øvrige omfattede dataejere

Aftalegrundlag og økonomi

2011

Overordnet ansvar: KMS

Projektledelse:

Øvrige involverede: KMS, DS, DMI, kommunerne, EBST?,
finansministeriet

Interne og eksterne interessenter: øvrige omfattede dataejere

Første rapportering

2010

Overordnet ansvar: KMS

Projektledelse: KMS

Øvrige involverede: ?

Interne og eksterne interessenter: øvrige omfattede dataejere

9. KOMMENDE AKTIVITETER

Involvering Hjemme hos ... Geoforum

10. KOMMENDE MØDER

11. MEDDELELSER OG EVT.

MILJØMINISTERIET

Kort & Matrikelstyrelsen

STATENS INFRASTRUKTURVIRKSOMHED FOR KORT OG GEODATA
